

工事内容説明書

建設工事名 平成19年度 [第19-W3101-01号] 清水港 興津第2埠頭岸壁(-10.0m)
19年港湾災害復旧工事 19年港湾災害査定 第0001号

請負者 株式会社 フタバコーケン

1. 工事概要

建設工事名 平成19年度 [第19-W3101-01号] 清水港 興津第2埠頭岸壁(-10.0m)
19年港湾災害復旧工事 19年港湾災害査定 第0001号

工事箇所 静岡市清水区 興津清見寺町 地先

発注者 静岡県清水港管理局
工務課 054-353-2206

請負者 株式会社 フタバコーケン
静岡市清水区港町1丁目6番4号
電話 (代) 054-352-1116

工期 着手 平成 20 年 3 月 29 日
完成 平成 20 年 7 月 30 日

工事内容 渡版復旧工


工種	種別	規格	単位	数量
取外し工	既設渡版取外し	3.73×3.70×0.5t (7枚)	枚	9.0
		3.93×3.70×0.5t (2枚)		
	グレーチング(小)取外し	6枚 / 箇所	箇所	4.0
渡版復旧工	RC渡版補修	3.73×3.70×0.5t	枚	7.0
	グレーチング(A)	3.93×1.246×150×3枚	箇所	2.0
	グレーチング(B)	1.98×1.246×150×3枚	箇所	4.0
	目地被覆金物取替		m	49.0
	栈橋目地補修	幅 0.25	m	4.3
取壊し工	渡版取壊し		枚	2.0
	グレーチング取壊し		箇所	4.0
	目地被覆金物取壊し		m	49.0
	栈橋目地撤去	幅 0.25	m	4.3

別紙 (資料 - 1・資料 - 2) 参照

計画工程表 別紙 (資料 - 3) 参照

施工方法

施工手順

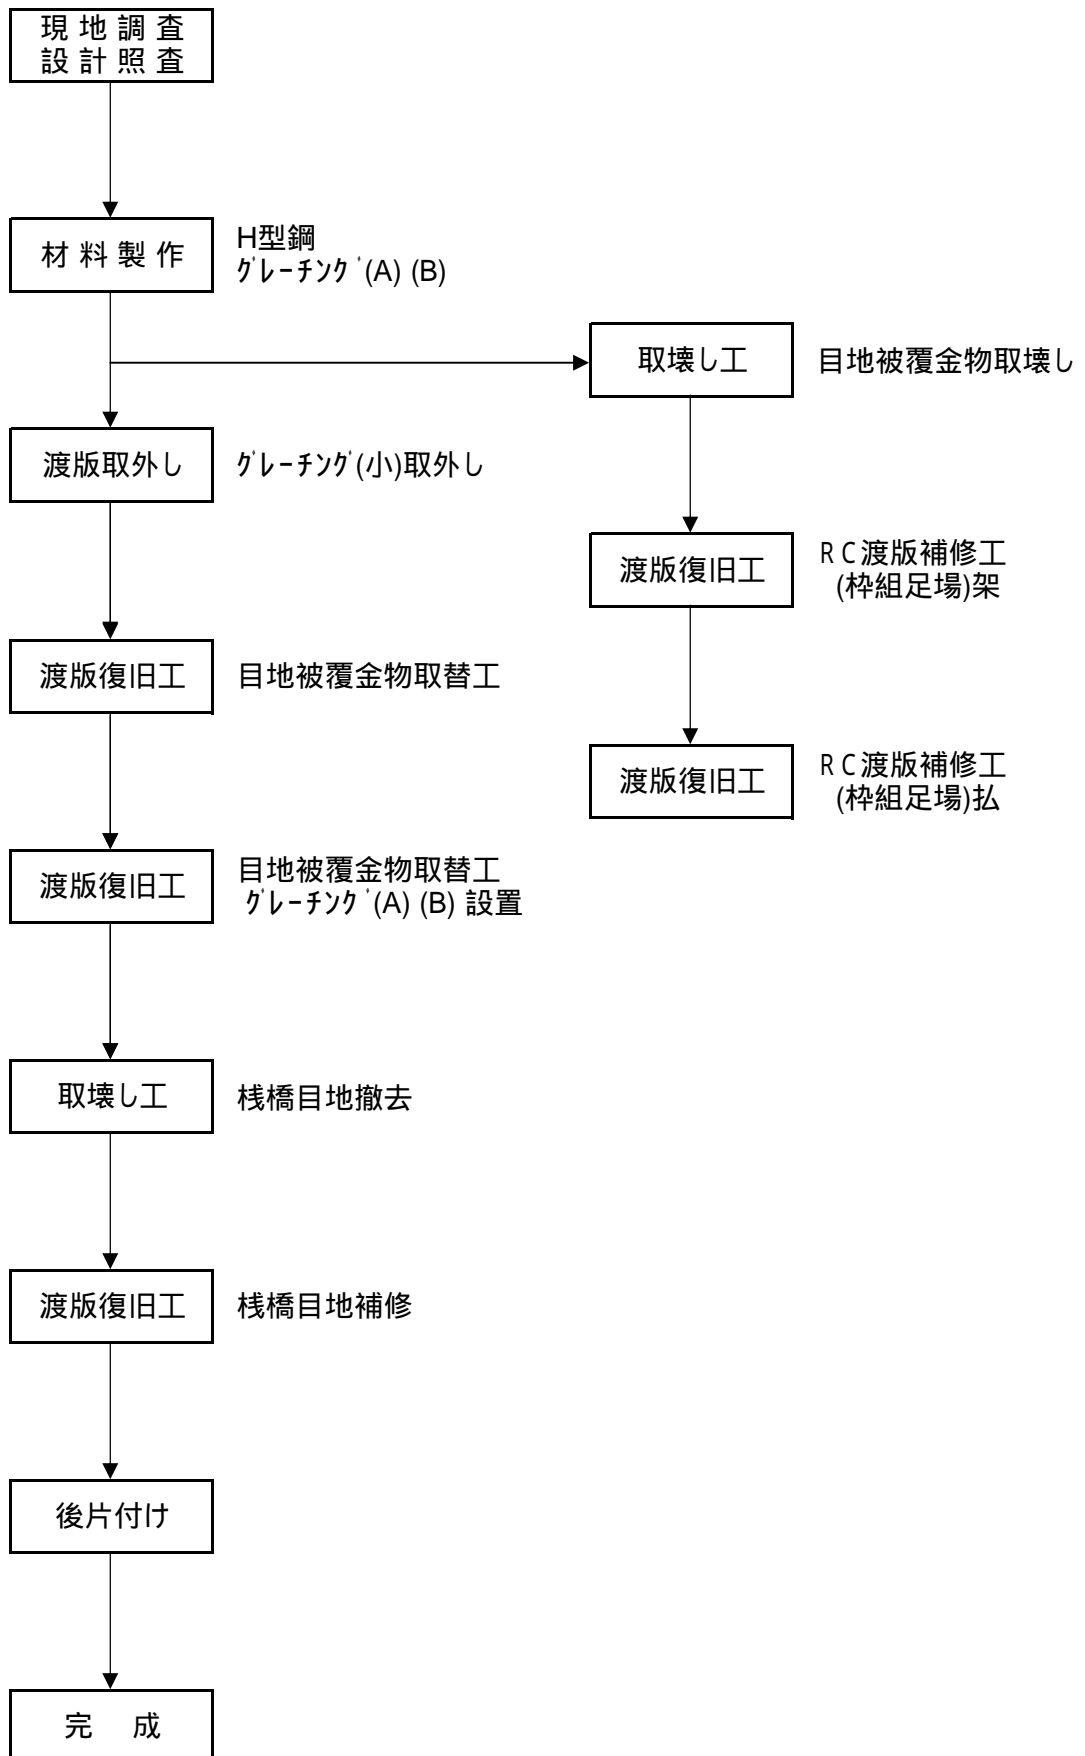

その他

船舶の係留・荷役作業について 施工時

- ・ 本工事施工時は、別紙 (資料 - 4) のように規制を行います。
- ・ 規制中は、安全確保のためバリケード内への立入を禁止します。
- ・ 船舶の係留においては、今まで同様行えますが
工事完了まで荷役作業は行えません。
- ・ 工事用車輛が往来しますので、ご協力をお願いします。

コンクリート養生時

- ・ 渡版復旧工 (目地被覆金物取替) におけるコンクリート打設養生期間 (約 2 週間) は現場休工となります。

天候及び工事の進捗状況により工程に変更が生じた場合は
その都度、協議を行います。



